

원흥관 3층 연구실험실 조성공사

MATERIAL SPECIFICATION BOOK

(건축)

2024년 9월 13일

MATERIAL SPECIFICATION

[인테리어필름]

공사명 : 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성날짜 : 2024/9/13

스펙번호 : SH - 01
설치장소 : 원흥관 3층 각실
위치 : 출입구



*현장감독관 협의후 작업시행

품명 : 인테리어필름(방염)
공급자 : LX 하우스 <https://www.lxhausys.co.kr/>
규격 : /
색상 및 번호 : PW 143 제노아 월넛
기타 :


* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[페인트]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성일자 2024/9/13

스펙번호 : PT-00
설치장소 : 원흥관 3층 각실 / 복도
위치 : 벽체

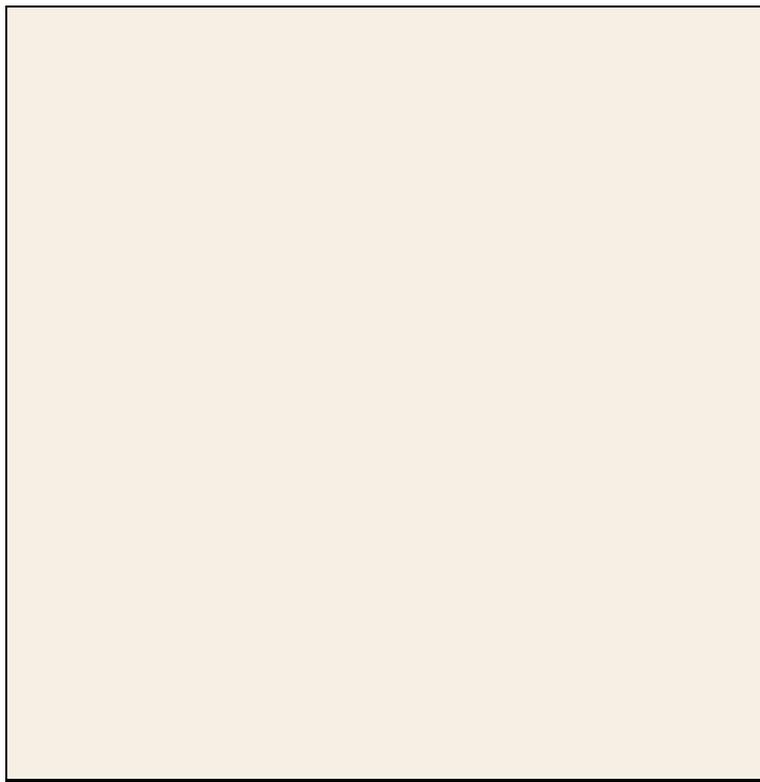

*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 친환경페인트
공급자 : 삼화페인트
규격 : /
색상 및 번호 : 삼화컬러 SH S 0502-Y50R
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[페인트]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성일자 2024/9/13

스펙번호 : PT-01
설치장소 : 원흥관 3층 각실 / 복도
위치 : 벽체 (낙방)



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 낙서방지페인트
공급자 : 삼화페인트
규격 : /
색상 및 번호 : 삼화칼러 SH S 2002-Y50R
기타 :


* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[페인트]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성일자 2024/9/13

스펙번호 : PT-02
설치장소 : 원흥관 3층 각실 / 복도
위치 : 걸레받이



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 친환경페인트
공급자 : 삼화페인트
규격 : /
색상 및 번호 : 삼화페인트 칼라 0002A (SH S 3000-N)

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[패브릭]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사

작성날짜 2024/9/13

스펙번호 : FB - 01

설치장소 : 원흥관 3층 각실

위치 : 출입구



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 방염패브릭

공급자 : 방염나라 <http://soundproof.kr/>

규격 : **감독관 칼라승인후 시공**

색상 및 번호 : DR 280

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[바닥재]

공사명 : 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성일자 : 2024/9/13

스펙번호 : FL - 01
설치장소 : 원흥관 3층 각실
위치 : 바닥



*현장감독관 협의후 작업시행

품명 : 우레탄(우레코트고경질)
공급자 : 삼화페인트 <https://www.lxhausys.co.kr/>
규격 : 3.0T
색상 및 번호 : 삼화페인트 칼라 0002A (SH S 3000-N)

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[바닥재]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사

작성날짜 2024/9/13

스펙번호 : FL - 02

설치장소 : 원흥관 3층복도

위치 : 복도(패턴A)



*현장감독관 협의후 작업시행

품명 : 데코타일

공급자 : LX 하우스시스 <https://www.lxhausys.co.kr/>

규격 : 450*450*3.0T

색상 및 번호 : DBT3051(스톤)

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[바닥재]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성날짜 2024/9/13

스펙번호 : FL - 03
설치장소 : 원흥관 3층복도
위치 : 복도(패턴B)



*현장감독관 협의후 작업시행

품명 : 데코타일
공급자 : LX 하우스시스 <https://www.lxhausys.co.kr/>
규격 : 450*450*3.0T
색상 및 번호 : DBT3062(콘크리트)
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[블라인드]

PROJECT 원흥관 3층 연구실험실 조성공사

작성날짜 2024/9/13

스펙번호 : BL-01

설치장소 : 원흥관 3층 각실

위치 : 창



아이보리



베이지



화이트



그레이



브라운



차콜

*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 고급암막방염롤블라인드

공급자 : 선일커튼 <http://skcurtain.kr/main/index.htm>

규격 : /

색상 및 번호 : 화이트

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[타일]

공사명 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성날짜 2024/9/13

스펙번호 : TL - 01
설치장소 : 원흥관 3층 복도
위치 : 벽체



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : PORCELAIN TILE (무광)
공급자 : 대동타일
규격 : 600 x 600mm
색상 및 번호 : SJG-313X1S2
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

공사명 : 원흥관 3층 연구실험실 조성공사
작성날짜 : 2024/9/13

스펙번호 : BA - 01
설치장소 : 원흥관 3층 각실
위치 : 도면참조



BL-201

평면불임

- 소형
- 긴다리

추가정보

품번 : BL-201
브랜드 : BATRA
사이즈 : 495×465×815
용량 : 담수량 7ℓ

*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 세면대
공급자 : 대림바스
규격 : 495*465*815
색상 및 번호 : BL-201 감독관협의
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.
