


# 만해관 1층 미당연구소 공간조정공사 계획(안)

## 법학만해관 1층

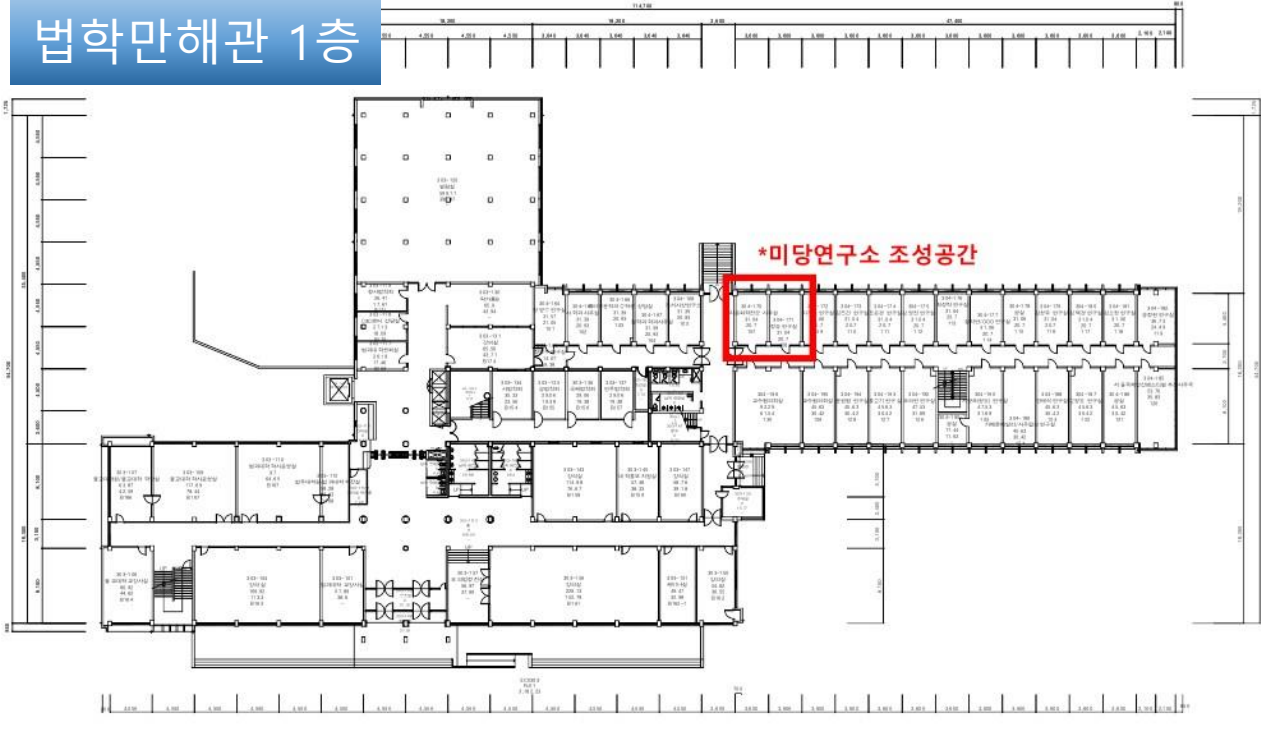

## 변경 전

304-170  
윤리문화학전공 사무실  
31.04  
20.7  
107

304-171  
공실  
31.04  
20.7  
108

## 변경 후

\* 공사 주요 내용 : 내부 **조적벽체 철거** 후 철거 부위 보수, 벽체도장, 바닥재 철거 후 신설, 등기구 교체, 설비공사(세면대 1개 철거) 암막 방염 블라인드 교체 등



\* 공간조성 공사 관련 상세 요청사항은 '사용 주체' 확정 후 확인 가능하나, 규모 등 고려할 때 일반적인 수준의 연구 공간으로 조성이 적절함

# 만해관 1층 미당연구소 공간조정공사

\*내부 집기 및 물품 폐기 - 단, 집기는 지정위치 이전(만해관 건물내)

조적벽체 철거후 폐기하고(주말 작업), 천장 및 벽체, 바닥 보수할 것



107호 싱크대 철거후 상하부장 포함한 하이그로 시 싱크대 신설(급배수 작업 포함) - 입상관 마감



LED 등기구 교체(6ea)


\*천장 파손부 - T-BAR 보강+마이톤 15T  
\*기존 창호 내측 전면 래핑 신설  
\*블라인드 철거후 암막 방염 블라인드 설치



\*내부 집기 및 물품 폐기 - 단, 집기는 지정위치 이전(만해관 건물내)



108호 싱크대 철거후 폐기(급배수 마감 포함)

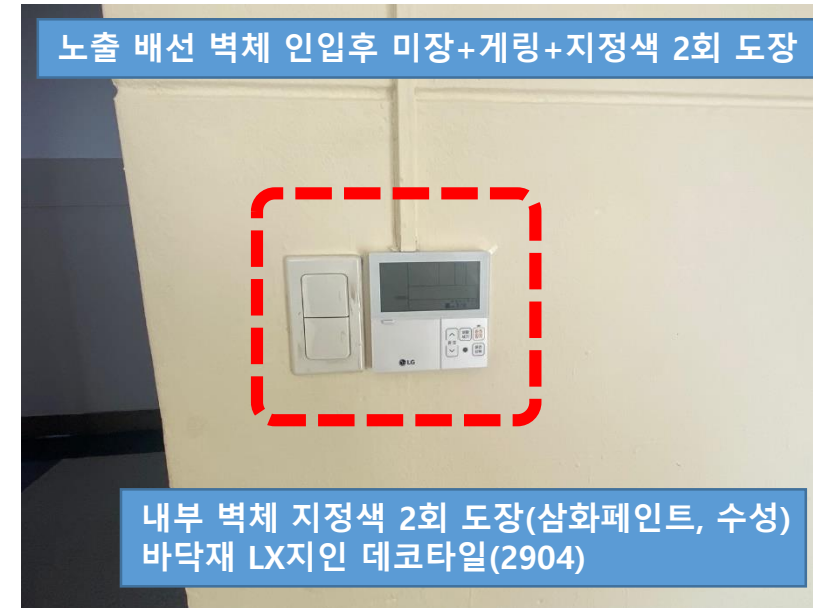

노출 배선 벽체 인입후 미장+게링+지정색 2회 도장

내부 벽체 지정색 2회 도장(삼화페인트, 수성)  
바닥재 LX지인 데코타일(2904)
