



□ 사진대지(금강관 환경개선공사)



B1F 샤워실 탕 철거 후 재시공

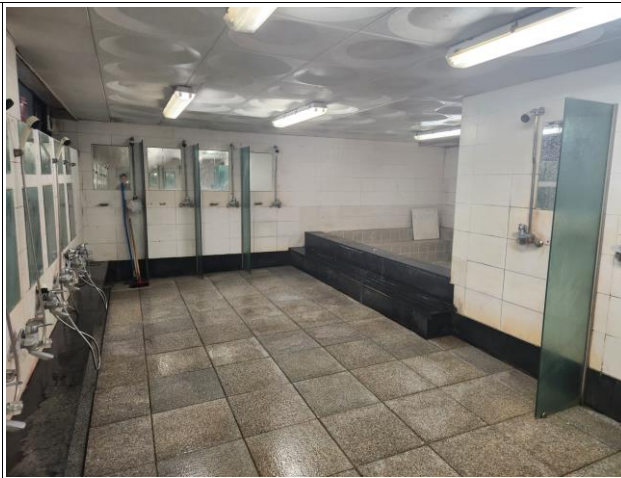

B1F 샤워실 바닥/벽체/천장 철거후 재시공  
(좌식샤워시설, 샤워기, 유리가벽, 유리등 모두 포함)

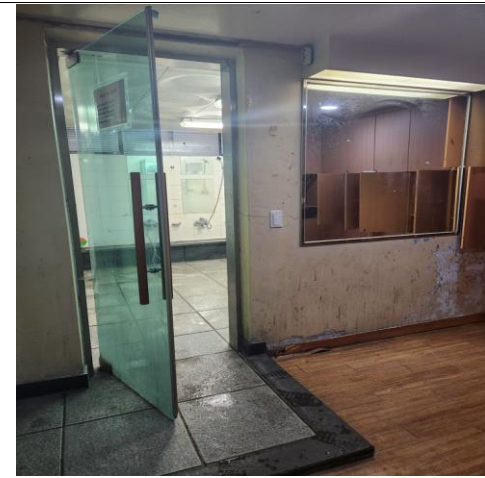


주출입구 및 샤워실 문 철거 후 재시공 + 바닥 석재 재시공



샤워실 환풍기 철거후 재시공(기존 AL창호 존치, 옛칭필름 시공)



탈의실 바닥/벽체/천장 철거후 재시공(락카포함 재시공)

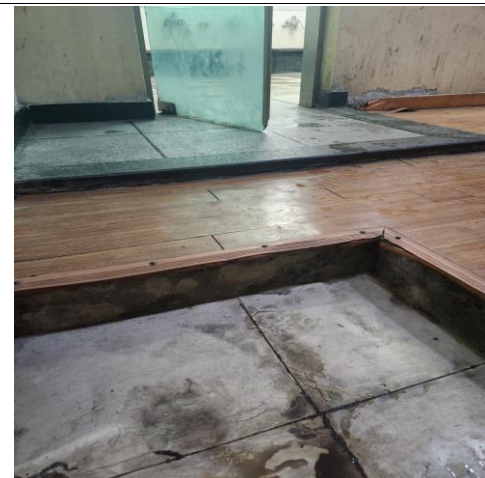

바닥 철거후 재시공(현 바닥 마감레벨 단차2개소 유지)

□ 사진대지(금강관 환경개선공사)



공용구간(복도, 계단실) 벽체 도장 + 도어 및 철재(서터등) 도장공사 포함  
+ 천장 기존천장(석고보드)위 도장공사 포함 (바닥은 공사제외)



공용구간(복도, 계단실) 벽체 도장 + 도어 및 철재(서터등) 도장공사 포함  
+ 천장 기존천장(석고보드)위 도장공사 포함 (바닥은 공사제외)



공용구간(복도, 계단실) 벽체 도장 + 도어 및 철재(서터등) 도장공사 포함  
+ 천장 기존천장(석고보드)위 도장공사 포함 (바닥은 공사제외)



복도 집기류(신발장, 수납장 등) 임시공간 이동 및 재배치 포함



공용구간 도장전 바탕처리(게링 및 퍼티) 포함견적




공용구간 벽체 하부(H=1,000) 낙서방지 페인트 반영

□ 사진대지(금강관 환경개선공사)



육상 목재시설물 오일스테인 마감(기존 목재부재 존치)

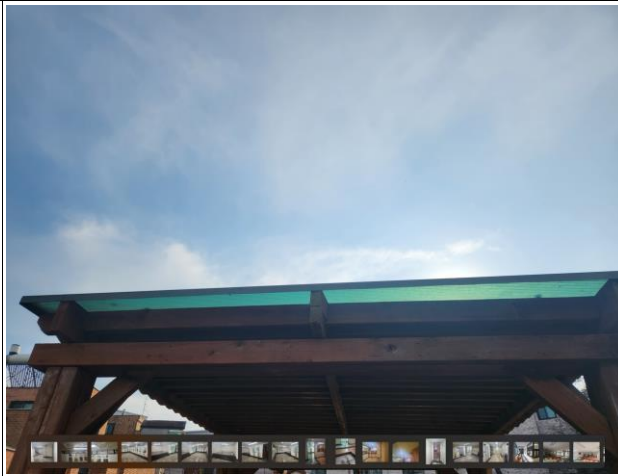


육상 목재시설물 천장(폴리카보네이트) 철거 후 재시공



육상 바닥데크 철거후 재시공(오일스테인 마감포함)



1F 식당 기존창호 / 커튼박스 / 블라인드 철거 후 신규설치  
(신규설치로 인한 천장 일부보수 포함)

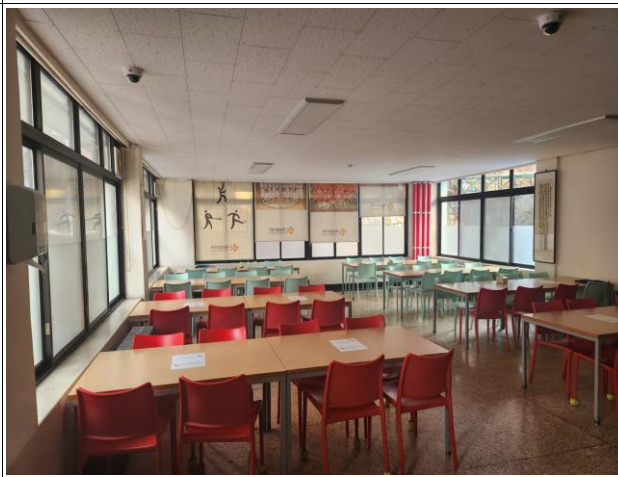

1F 식당 벽체 하부(H=1,000) 낙서방지 페인트 도장



커튼박스 및 블라인드 철거 후 신규설치
